



Osloregionen

14. februar 2025

Velkommen til oppstartsmøte Koordineringsgruppe *Energistasjoner fase II* (2025-2026)




Agenda

Saksnr	Sak
1	Velkommen til oppstartsmøte koordineringsgruppe Energistasjoner fase II
2	Sluttrapport Energistasjoner for grønn næringstransport 2022-2024 og evaluering
3	Presentasjon av prosjekt Energistasjoner fase II, prosjektplan og organisering
4	Koordineringsgruppens rolle og mandat
5	Videre arbeid – neste møte
6	Eventuelt



Osloregionen interkommunalt politisk råd

- *Visjon:* En bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region
- Flerkjernet struktur, med sterke sentra for verdiskaping i hele regionen
- Etablert januar 2005
- 65 kommuner, inkl Oslo og kommuner i alle Østlandsfylker
- Politiske organer
 - Representantskapet er høyeste organ
 - Styret
 - Interessepolitisk utvalg
- Konsensusbasert organisasjon

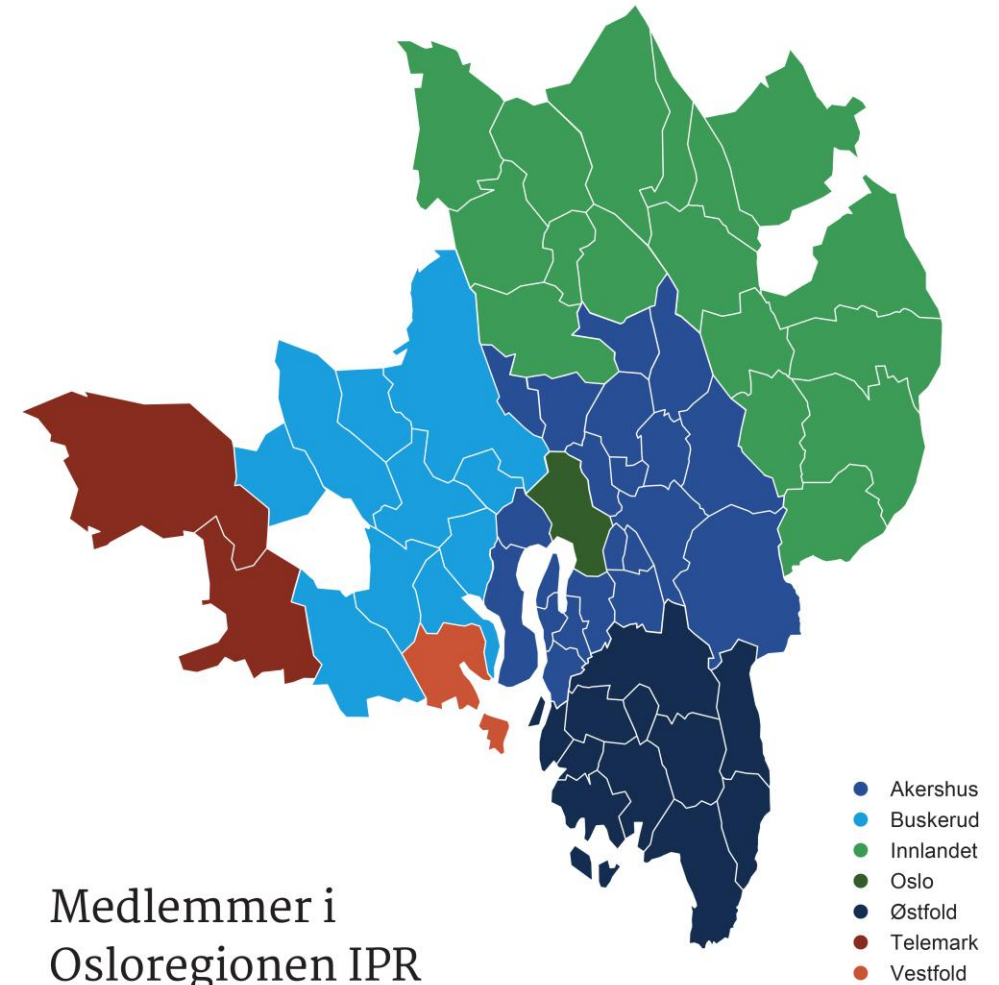



Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonal konkurransedyktig region

Overordnede mål:

- Å bli et lavutslippssamfunn mot 2050
- Å ha en flerkjernet utvikling, basert på lokale fortrinn
- Å ha en attraktiv hovedstadsregion for næringsetablering, investering og kompetent arbeidskraft



Innsatsområder og tverrgående tema

Konkurranseskraft og næringsutvikling	Klima, miljø og natur	Transport og mobilitet	By- og regionutvikling
Kraft Sirkulærøkonomi Internasjonal profilering Grønn næringstransport Miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag			



Osloregionen

Sak 2

Sluttrapport Energistasjoner for grønn næringstransport 2022-2024 og evaluering



Osloregionen

Prosjektet *Energistasjoner for grønn næringstransport 2022-2024*

- Samarbeid mellom Østlandssamarbeidet (fylkeskommuner) og Osloregionen IPR (kommuner)
- Formål: **Bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet**
- Prosjektperiode 2022-2024
- Samarbeid Grønt landtransportprogram og Statens vegvesen
- Støttet av Klimasats



Østlandssamarbeidet



Innlandsporten. Foto: Stange kommune

Prosjektinnhold - arbeidspakker

Arbeidspakke 1 – Areal og identifisering av lokasjoner

- Kartlegge og følge opp aktuelle lokasjoner
- Visualisering av potensielle tomter
- Korridorperspektiv

Arbeidspakke 2 – Dialog og kunnskap

- Utvikle kompetanse
- Samle kunnskap om prosess for etablering av energistasjoner
- Identifisere barrierer

Arbeidspakke 3 – Saksbehandling og veileder

- Effektivisere saksbehandling om etablering av energistasjoner
- Utvikle veileder

Arbeidspakke 4 - Kommunikasjon

- Intern kommunikasjon
- Ekstern kommunikasjon

Arbeidspakke 5 - Prosjektledelse


- Oppstartsaktiviteter
- Fortløpende prosjektledelse
- Etablering av ekstern referansegruppe
- Rapportering

For alle arbeidspakker: Samarbeid med aktuelle aktører og prosjekter



Hovedresultater energistasjonsprosjekt 2022-2024

- Arbeidspakke 1, Areal og lokasjoner:
 - Identifisert potensielle lokasjoner.
 - Gjennomført regionale seminar/verksted for identifisering av mulige lokasjoner og avklart videre prosess.
 - Befaringer og bistått i prosesser => søknader til Enova som har fått tilsagn
- Arbeidspakke 2 – Dialog og kunnskap:
 - Åpning av første komplette energistasjon ved Innlandsporten, Stange kommune – bidratt med seminar og tema på dagsorden
 - Kunnskapsutvikling, f.eks. teknologiwebinar om ulike energibærere
 - Gjennomført arrangementer for dialog, kunnskap, samarbeid
 - Kommuner, fylkeskommuner, transportaktører, utbyggere av energistasjoner, nettselskap, GLP, SVV
- Arbeidspakke 3 - Veileder: Utviklet veileder for etablering av energistasjoner

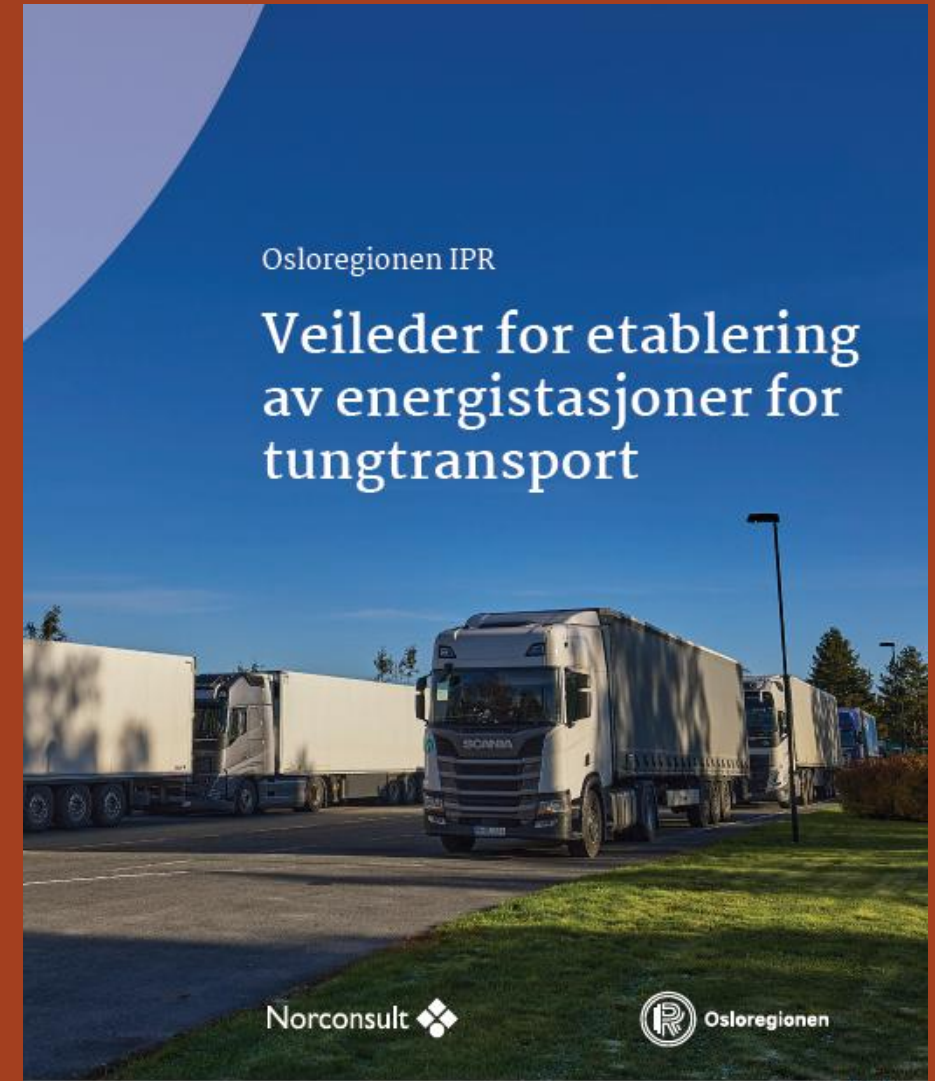



Arbeidspakke 1 – Areal og identifisering av lokasjoner

- Befaringer
- Kartløsning
- Regionale workshops

Arbeidspakke 1 – Areal og identifisering av lokasjoner

- Kartlegge og følge opp aktuelle lokasjoner
- Visualisering av potensielle tomter
- Korridorperspektiv

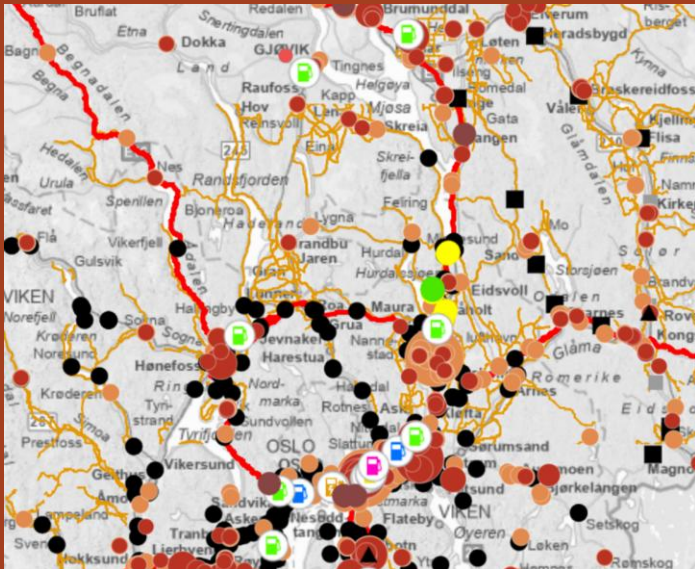


Foto: Lotta Möllerfalk/Østlandssamarbeidet



Foto: Torun Degnes



Arbeidspakke 2 – Dialog og kunnskap

- Det er gjennomført et stort antall møter, seminarer, teknologiwebinarer, samt noen konferanser som del av arbeidet med å legge til rette for dialog, samarbeid og kunnskapsinnhenting.

Arbeidspakke 2 – Dialog og kunnskap

- Utvikle kompetanse
- Samle kunnskap om prosess for etablering av energistasjoner
- Identifisere barrierer



Foto: Kristian Singh-Nergård/Østlandssamarbeidet



Foto: Per Dagfinn Wolden




Foto: Kristian Singh-Nergård/Østlandssamarbeidet

Arbeidspakke 3 - veileder

- Utviklet veileder for etablering av energistasjoner
- Målgruppe kommuner, men også stor nytteverdi for andre
- Enova viser til veilederen i sine utlysninger

Arbeidspakke 3 – Saksbehandling og veileder

- Effektivisere saksbehandling om etablering av energistasjoner
- Utvikle veileder

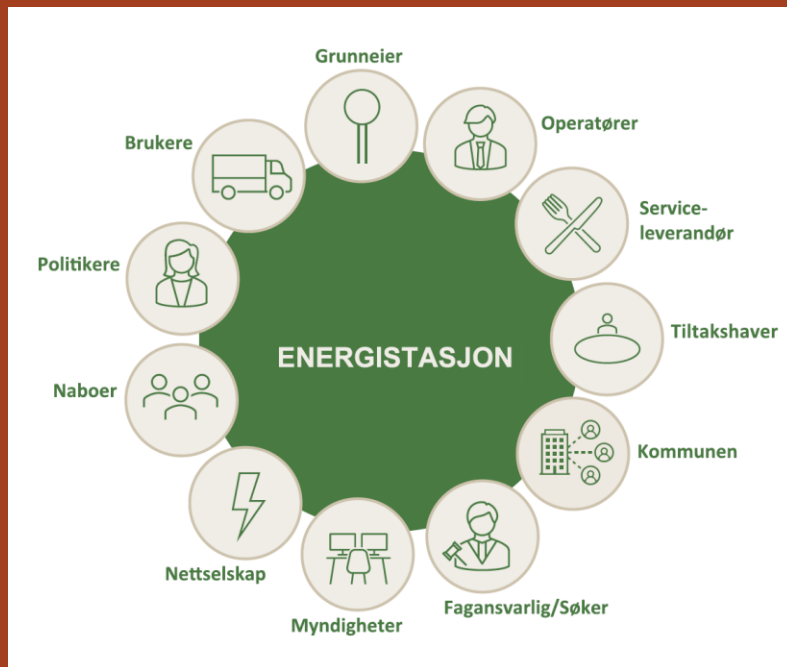

Osloregionen IPR

Veileder for etablering av energistasjoner for tungtransport

Norconsult

 Osloregionen



Arbeidspakke 4 - Kommunikasjon

- Utviklet nettsiden, energistasjoner.org, og lanserte den i februar 2023. Denne har vært oppdatert jevnlig
- Kommunikasjonsaktiviteter og medieoppslag
- Fotoarkiv

Arbeidspakke 4 - Kommunikasjon

- Intern kommunikasjon
- Ekstern kommunikasjon



Arbeidspakke 5 - prosjektledelse

- Jevnlige prosjektteam-møter (Osloregionen og Østlandssamarbeidet)
- Jevnlige koordineringsgruppemøter med deltakere fra kommuner og fylkeskommuner
- Rapportering til administrative grupper i Osloregionen og Østlandssamarbeidet
- Rapportering til styringsgrupper. Det er to styringsgrupper, da det opprinnelig var omsøkt som to prosjekter.

Arbeidspakke 5 - Prosjektledelse

- Oppstartsaktiviteter
- Fortløpende prosjektledelse
- Etablering av ekstern referansegruppe
- Rapportering



Osloregionen

Sak 3

Presentasjon av prosjekt Energistasjoner fase II,
prosjektplan og organisering



Osloregionen

Energistasjonsprosjekt fase II – 2025-2026

- Prosjektets mål: Bidra i koordinering, planlegging og etablering av lade- og fylleinfrastuktur for nullutslipp og klimanøytralt drivstoff i kommuner på Østlandet.
- Energistasjonsprosjekt fase II
 - Videreføring av prosjekt fase I med nødvendige justeringer
 - For å nå mål om omstilling av næringstransporten: Hva er det behov for?
 - Gjennomføre flere regionale workshops
 - Videreutvikle veilederen
 - Følge opp igangsatte initiativ
 - Samarbeid med GLP og andre partnere



Foto: Torun Degnes

Arbeidspakker – Energistasjoner fase II - skisse

Arbeidspakke 1 – Videreutvikling veileder

- Digitalisering av veileder
- Videreutvikling
- Spredning
- Samarbeid med KS
-

Arbeidspakke 2 - Regionale verksted

- Gjennomføre regionale verksted + oppfølging
- Kompetanseheving
- Kunnskapsspredning

Arbeidspakke 3 – Samarbeidsprosjekter og konkrete case

- Prosjektsamarbeid GLP
- Havnecase
- Evt konkrete case fra arbeidspakke 2

Arbeidspakke 4 – Rammebetingelser og internasjonale forhold

- Rammebetingelser
- Følge utvikling Internasjonale forhold, som f.eks. TEN-T, AFIR
- Internasjonale prosjekt

Arbeidspakke 5 – prosjektledelse og kommunikasjon

- Oppstartsaktiviteter
- Kommunikasjon
- Koordineringsgruppe
- Etablering av eksternt referansegruppe
- Rapportering

Felles for alle arbeidspakker: samarbeid med aktuelle aktører og prosjekter

Arbeidspakke 1 – Videreutvikling veileder - foreløpig


Aktiviteter

Nyhetssak om veileder - KS-nettside

Digitalisering av veileder

Videreutvikling

Spredning

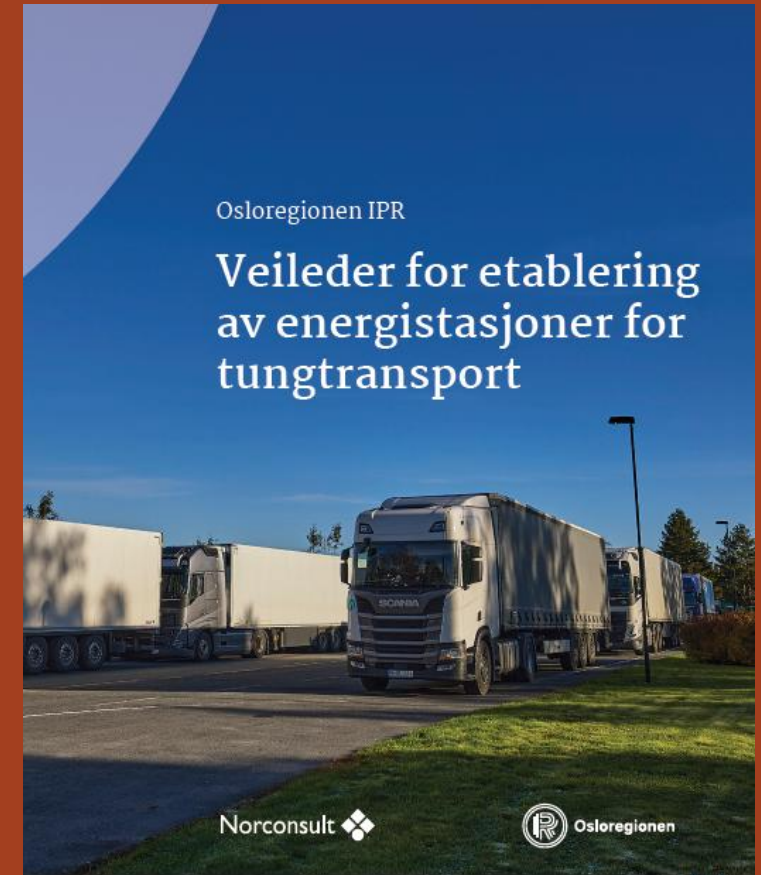



Arbeidspakke 2 – Regionale workshop - foreløpig

Aktivitet

Gjennomføre regionale verksted + oppfølging

- Mosseregionen
- Drammensregionen
- Gjøvikregionen
- Ringeriksregionen
- Flere?

Kompetanseheving

Kunnskapsspredning



Regionale verksted for energistasjoner

- Seminarer/verksted i og Drammensregionen og Mosseregionen
- Første runde våren 2024
- Verksted nr 2 gjennomført i oktober/november
- Oppfølging avhengig av behov etter verksted nr 2
- **Formål (eks Drammen):** Konkretisere videre arbeid for omleggingen til grønn næringstransport og utviklingen av nødvendig energiinfrastruktur i Drammensregionen. Tre tema:
 - vurdering av konkrete lokasjoner til energistasjoner som supplerer etablert og planlagt depotlading
 - planprosesser i kommunene for å sette av areal
 - mulig samarbeid for raskere omlegging av næringstransporten og tilgjengeliggjøring av grønn energi





Arbeidspakke 3 – Samarbeidsprosjekter og konkrete case - foreløpig

Aktiviteter
Langdistansebuss-prosjekt samarbeid GLP
Ladeinfrastruktur i samarbeid med MER (GLPs prosjekt), flere aktuelle lokasjoner
Samarbeid MEF, massehåndtering og lokalisering lade-/fyllestasjoner
Havnecase
Evt oppfølging konkrete case fra arbeidspakke 2



Arbeidspakke 4 – Rammebetingelser og internasjonale forhold

Aktiviteter

Rammebetingelser og virkemidler i Norge

- Enova
- Effekttariffer
- Andre virkemidler, bompenger (også utover bomringene), kollektivfelt

Offentlige anskaffelser for å fremme grønn transport, se veileder i GLP/LUP

Følge utvikling internasjonale forhold, som f.eks. TEN-T, AFIR

Aktuelle internasjonale samarbeidsprosjekter



Arbeidspakke 5 – Prosjektledelse og kommunikasjon

Aktiviteter
Oppstartsaktiviteter
Kommunikasjonsaktiviteter, lage egen komm.plan
Møter koordineringsgruppen - 14.feb - Mai - Okt/nov
Rapportering til styringsgruppe
Ekstern referansegruppe
Interne prosjektmøter – prosjektteam
Møter samarbeidspartnere, GLP, SVV, KS, Østlandssamarbeidet, andre



Osloregionen

Sak 4

Koordineringsgruppens rolle og mandat



Mandat for koordineringsgruppe for prosjektet Energistasjoner fase II

Hovedmål for prosjektet er å bidra til koordinering, planlegging og etablering av lade- og fylleinfrastruktur for nullutslipp og klimanøytralt drivstoff i kommuner på Østlandet. Som en del av prosjektorganiseringen etableres det en koordineringsgruppe som har følgende mandat:

1. Som medlemmer i koordineringsgruppens inviteres representanter fra kommuner og fylkeskommuner på Østlandet, med særlig interesse for prosjektets formål. Gruppen skal være representativ for regionen, med hensyn til geografisk spredning.
2. Koordineringsgruppen velger en leder og nestleder
3. Koordineringsgruppen møtes 2-4 ganger i året. Minst to av møtene gjennomføres med fysisk oppmøte.
4. Koordineringsgruppen skal sikre at aktiviteter i prosjektet gjennomføres godt koordinert og i tråd med prosjektets mål. Det skal bidra til effektiv ressursbruk for deltakerne, og til et best mulig resultat fra gjennomføringen av prosjektet.
5. Koordineringsgruppen skal bidra med innspill, faglige råd og kvalitetssikring i planlegging av aktiviteter i arbeidspakkene, herunder innspill til det interessepolitiske arbeidet for grønn næringstransport.
6. Koordineringsgruppen skal bidra til å rekruttere deltakere til aktiviteter som gjennomføres i prosjektene, som workshops, møter etc.



Osloregionen

Sak 5

Videre arbeid – neste møte
